



יומן עבודה - 4.10.26

כתובת: הגפן 18, ראשון לציון

שם הפרויקט: נוף הגפן

שם הקבלן: י.מ. נחשון בנייה בע"מ


מה מזג האוויר באתר: גשם קל ☁️

יום ראשון - 4.10.26

#	קבלן	כמות פועלים באתר	תיאור עבודה
1	שלד	10 עובדים	קבלן השלד עבד על יציקת התקרה בקומה 6. ממשיכים בעבודות טפסנות בקומה 7.
2	אינסטלציה	12 פועלים	האינסטלטור עבד בקומה 1 על הצנרת האנכית. השחלת צנרת אינסטלציה בתוך הדירות בקומה 2.



עבודות אינסטלציה קומה 1

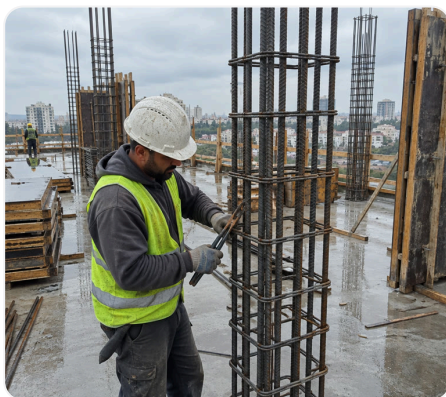

עבודות טפסנות קומה 7



עבודות יציקה קומה 6

#	הערות מפקח	הערות קבלן
1	- קיימתי פגישה עם הקבלן בשטח בנושא הבטיחות, עם דגש על מעקות בזמן היציקה. - הקבלן אישר שיתקין מעקות ויקפיד על הבטיחות בזמן היציקות, וכן במרפסות השמש. - יש לזמן את הקונסטרוקטור לפני כל יציקה.	✓ מאשר
